

Tag de la sub estación:		OT:		Lider:		Inicio:	
Ubicación:		Fecha:		Supervisor:		Fin:	


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:		
PELIGRO	RIESGO	CONTROL
Traslado al el área de trab.	Volcadura, choque, tropiezos, golpes	Manejo defensivo, uso de vías peatonales, uso de 3 puntos de apoyo
Herramientas	Golpes, cortes, lumbalgias	EPP adecuado, inspección, entrenamiento, orden y limpieza
Energía eléctrica	Contacto directo, indirecto, arco eléctrico	Lototo, medición de energía cero y/o residual, uso epp dieléctrico y/o ignígugo
Equipos	Atropellos, golpes	Delimitación de áreas, comunicación, autorizaciones.

SEGURIDAD	"✓" "NA"	OBSERVACIONES
Completar los permisos de trabajo según la actividad adjuntados a la OT (ATS y/o PETAR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspección de herramientas y evitar exceso de carga (>25 kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usar implementos de seguridad personal de acuerdo al tipo de trabajo (EPP's).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizar el aislamiento, bloqueo y etiquetado de la sub estación eléctrica, evaluar necesidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmación de energía "0" (cero) en tablero, coordinación con Centro de Control de Energía.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
Tipo de SPT:	Aislado	Contrapeso	Horizontal	Vertical	Delta	Malla
Cant. Pozos a Tierra:		Nº Plano As Built:				


ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

POZOS A TIERRA

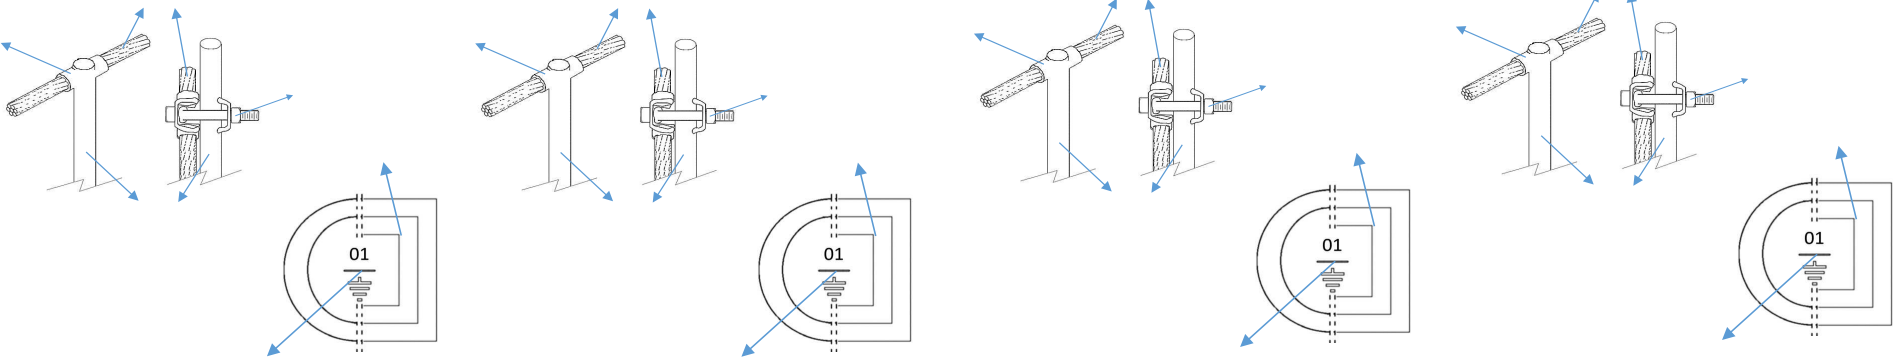


BARRAS EQUIPOTENCIALES


Barras No Aisladas

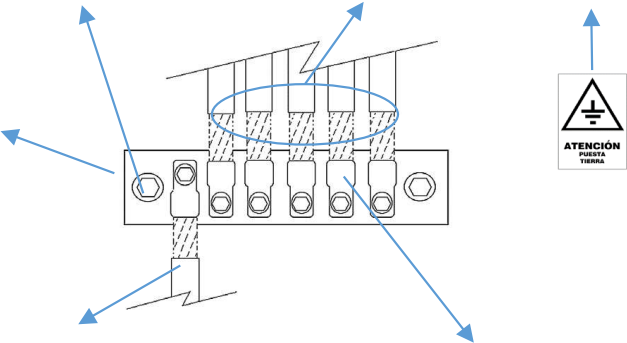


Barras Aisladas

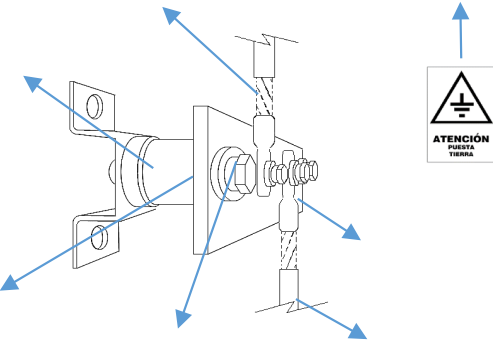

CERCO PERIMÉTRICO

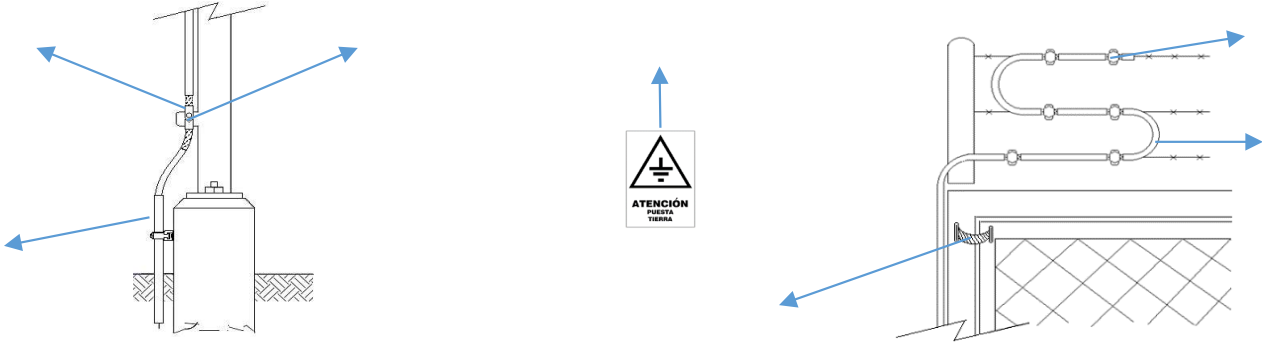

TRANSFORMADOR

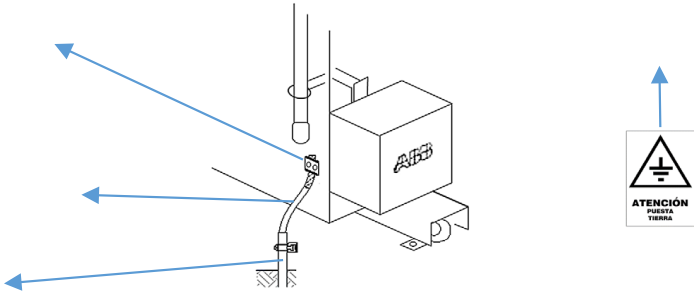

RECOMENDACIONES - OBSERVACIONES		# AVISO
1.- .....		.....
2.- .....		.....
3.- .....		.....
TÉCNICO LIDER:    —	SUPERVISOR:	
FOTOCHECK:	FOTOCHECK:	
FIRMA:	FIRMA:	
